DOCUMENT FICTIF CRÉÉ POUR LE DÉMONSTRATEUR - AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

Fiche de fabrication et de livraison

Prémur A2 PM 106 - Domaine de Fontbelleau, tour A2, noyau central, étage R+1
Fabricant : Préfa Démo (usine fictive) - Référence : DEMO-PM106
Commande : CMD-301-A2-0106 (fictive) - Titulaire du lot 301 : Veck Construction (entreprise du groupe)

Caractéristiques de l'élément

Dimensions	**1,78 m x 2,57 m x 0,20 m**	*Maquette Revit (élément 439362)*
Composition	**2 peaux de 6 cm + vide de 8 cm à remplir**	*Hypothèse du scénario*
Béton des peaux	**C30/37**	*CCTP 301 ind B §6.6.3*
Armatures	**HA + treillis soudés, raidisseurs**	*CCTP 301 ind B §6.6.3 / détail fictif*
Poids au levage	≈ **1,37 t**	*Estimation : 2 x 0,06 m x 4,57 m² x 2,5 t/m³*
Inserts de levage	**2 inserts en tête, entraxe 1,10 m**	*Fictif*

Fabrication et contrôle usine

Visa du plan de fabrication	**06/10/2026**	*Fictif*
Coulage des peaux	**27/10/2026**	*Fictif*
Contrôle usine	**30/10/2026 - conforme**	*Fictif*
Stockage usine	**Sur chevalet, vertical**	*Fictif*

Livraison

Bon de livraison	**BL-DEMO-0411**	*Fictif*
Date de livraison	**04/11/2026**	*Fictif*
Réception chantier	**Contrôle visuel : épaufrure 3 cm angle bas**	*Fictif - voir réserve du passeport*

Élévation de principe (échelle libre)

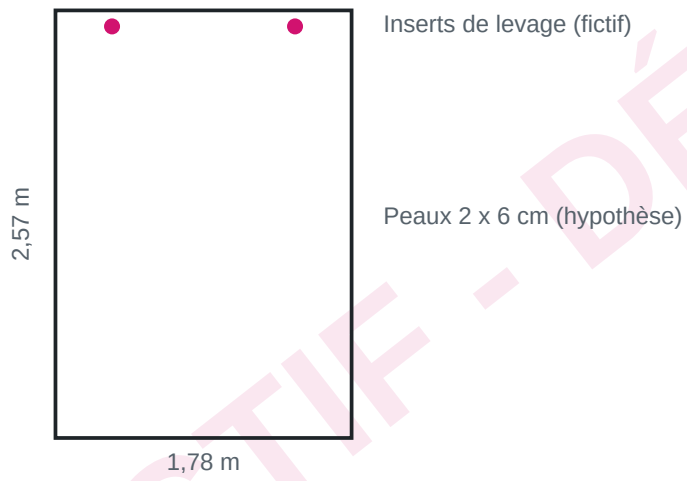

Ce document a été créé pour illustrer le passeport numérique A2 PM 106 (projet ESCT MP2-BC1-P3).
Il ne provient d'aucun fabricant. Les seules données vérifiées sont celles dont la source cite la maquette ou le CCTP.
